



Arbetsprocess för Förebyggande underhåll, Komplex anläggning - Väg

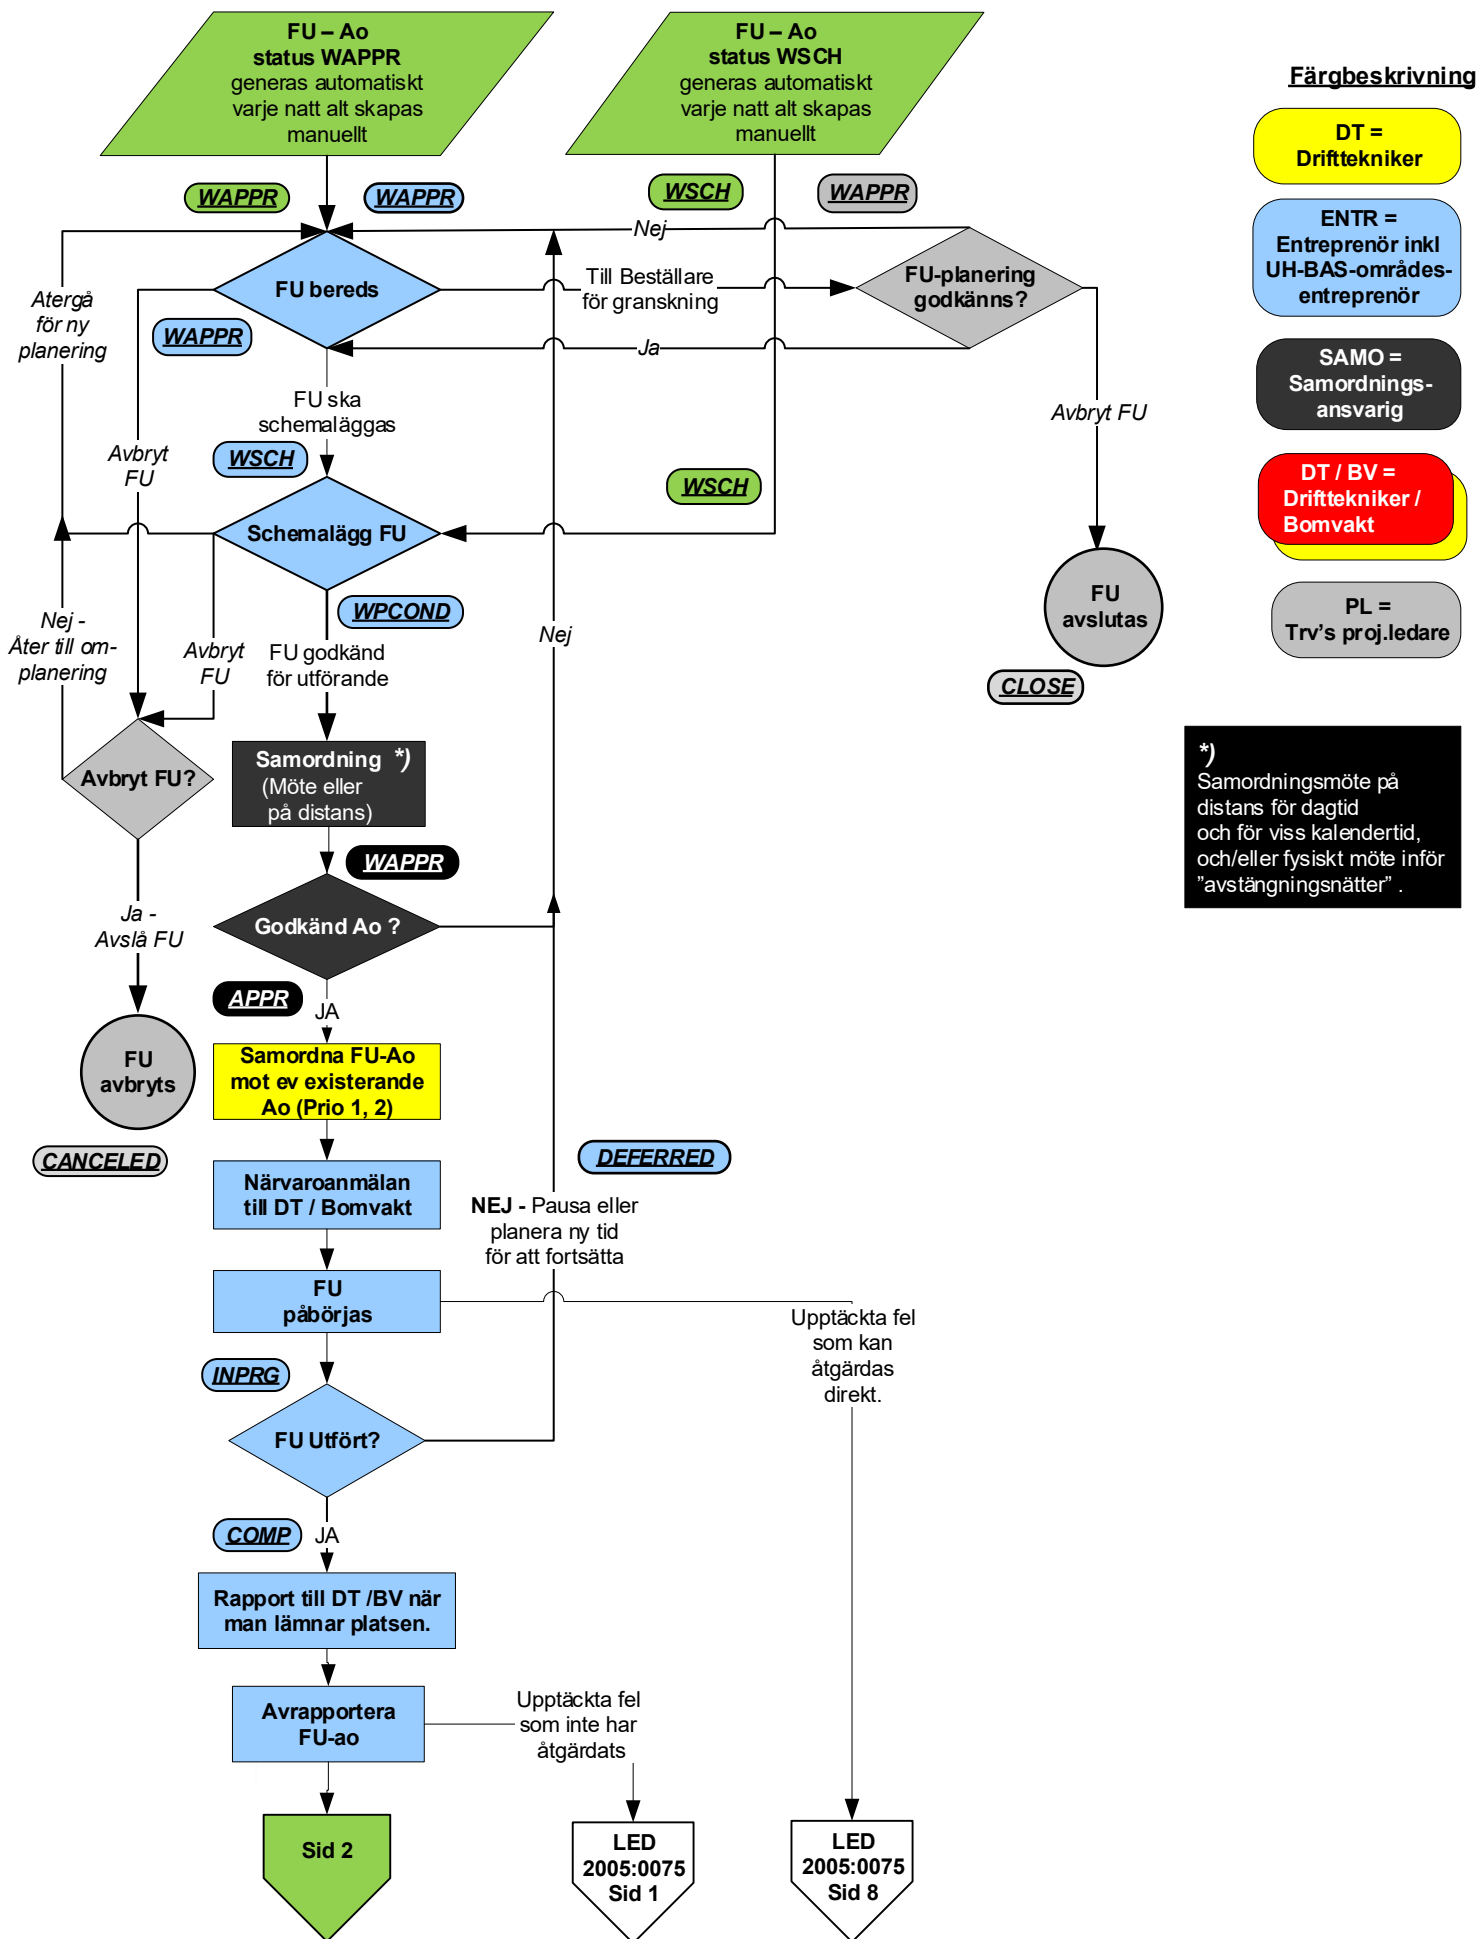


Arbetsprocess för Förebyggande underhåll, Komplex anläggning - Väg

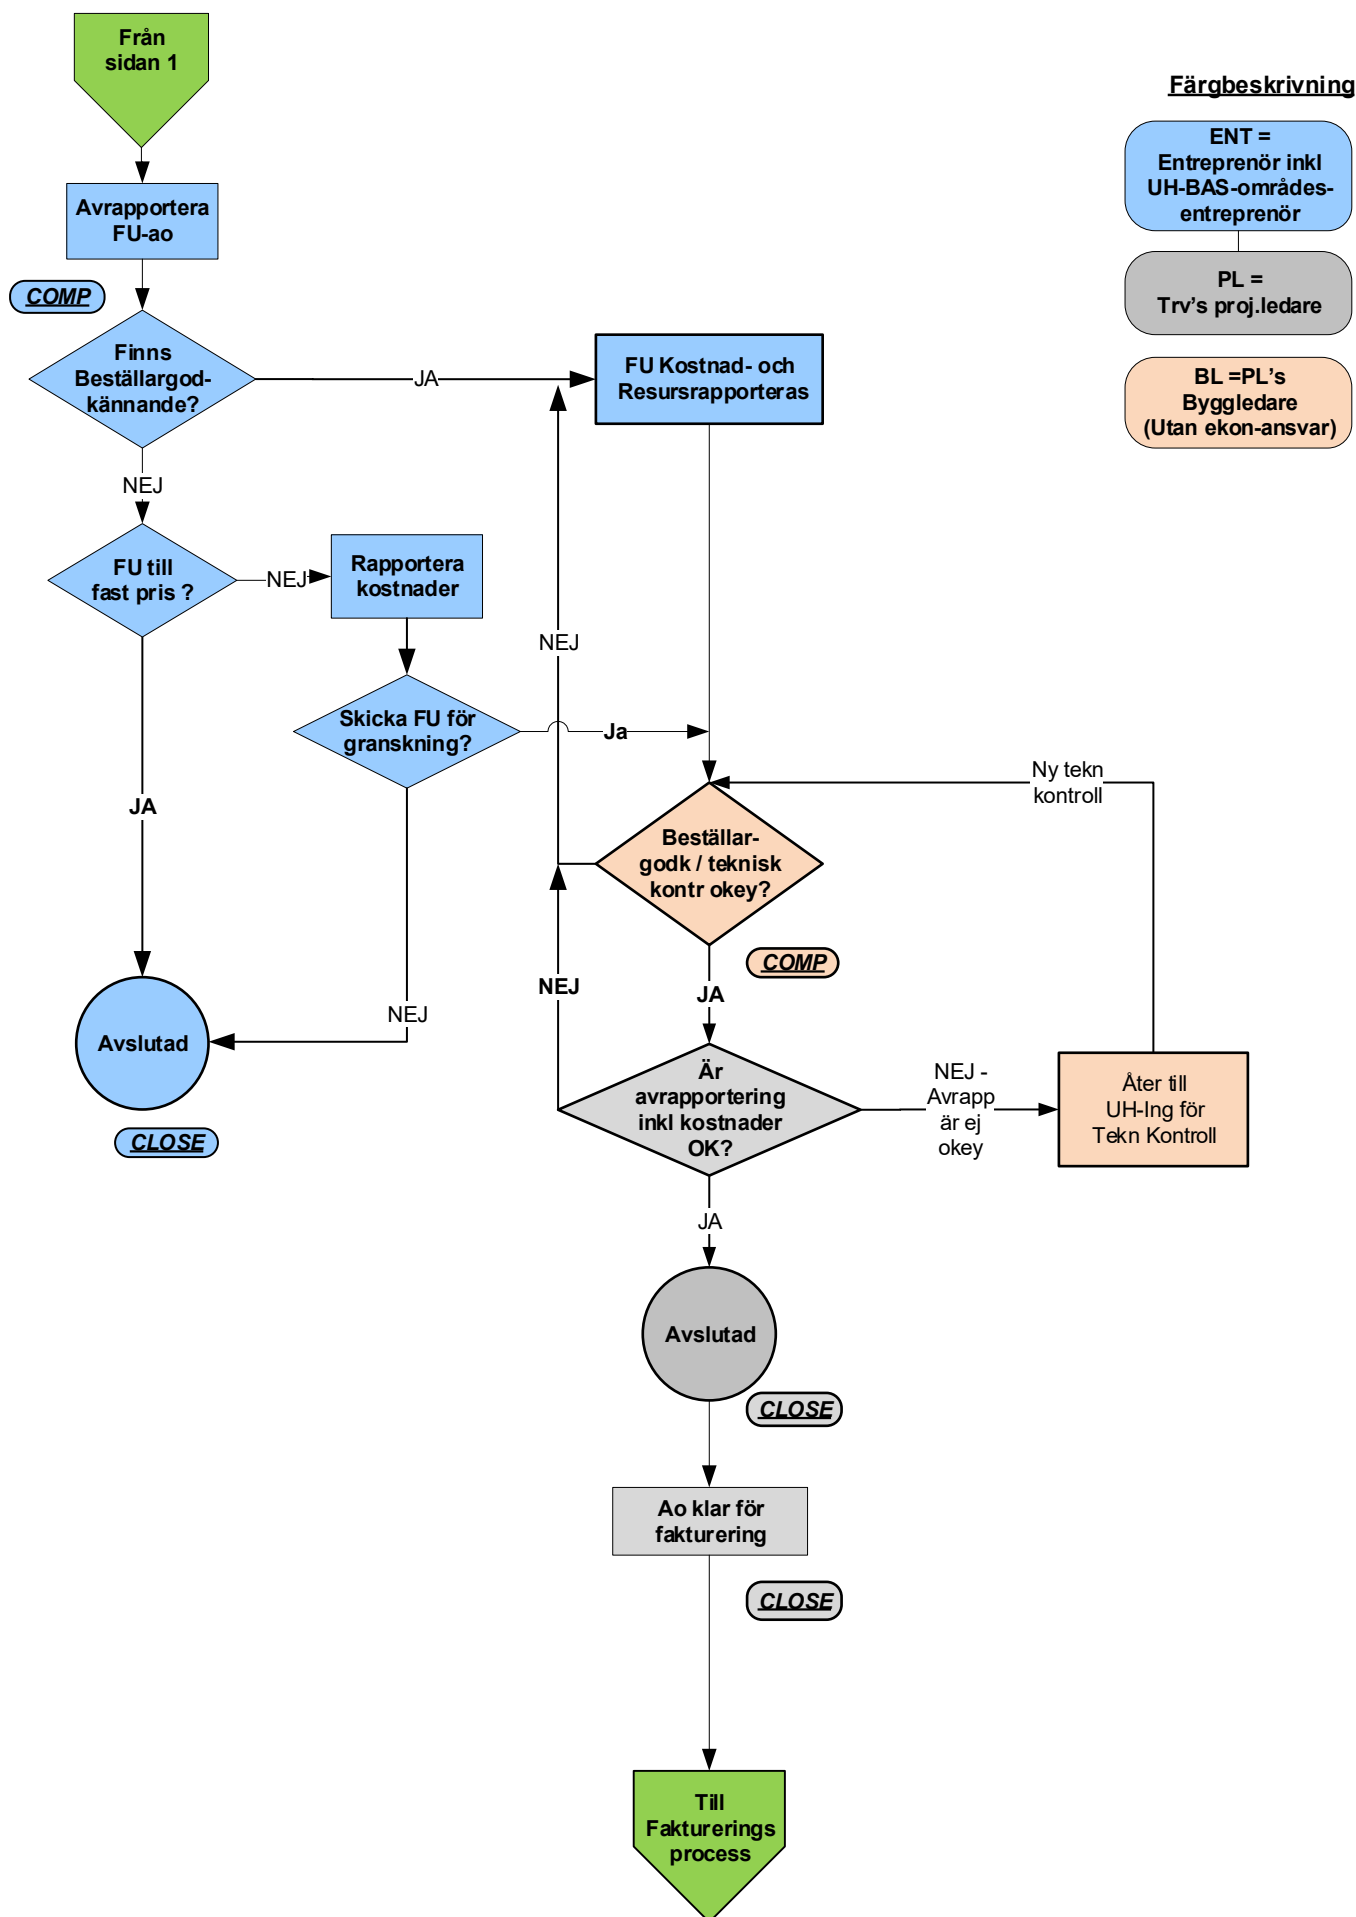

Projekt Förvaltning komplexa anläggningar. Gus-version	Page 2 of 3	Upprättad av: S-O Andersson, Uppdat: Anders Eier & Thomas Rolén	Datum 2022-09-07
Process Process FU - Förebyggande underhåll Komplex ver 6.0 Gus		Godkänd av: Lars Schillström	Datum 2022-10-03

Arbetsprocess för Förebyggande underhåll, Komplex anläggning - Väg

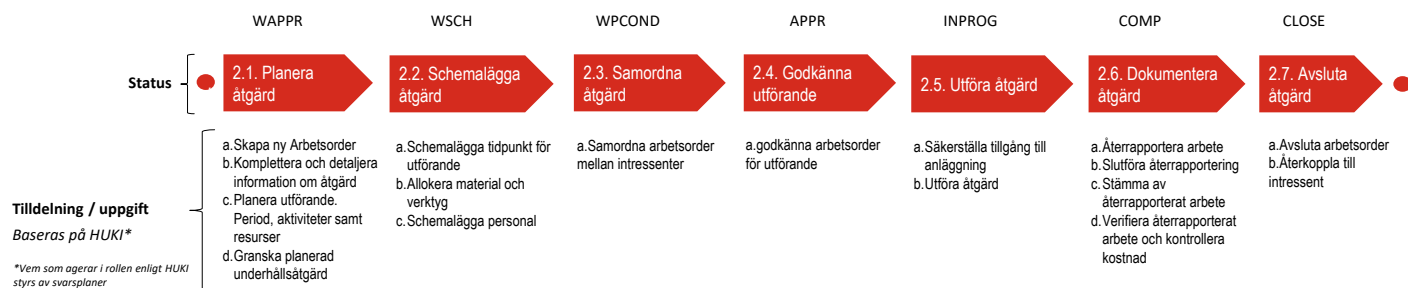

Statusanvändning för Ao i arbetsflödesprocessen FU - Förebyggande underhåll – Komplex anläggning

Status Tilldelning och Förklaring

WAPPR	"Väntar på godkännande" En ny Ao får denna status, ansvarig för Ao godkänner och ansvarig planerare planerar in åtgärden.
WSCH	"Väntar på schemaläggning" En Ao som väntar på att utförande organisation ska schemalägga tid för utförandet och boka upp de resurser (personal, verktyg, material) som behövs för ett genomförande.
APPR	"Godkänd" Arbeten som är godkända för utförande, i denna status övergår ansvaret för Ao till den som ska utföra arbetet
INPRG	"Pågår" När den som utför arbete säkerställt tillgång till anläggningen och ska börja jobba så sätts status på Ao i INPRG (Pågår). INPRG innebär att jobbet är under utförande.
COMP	"Klar " Denna status sätts efter utfört arbete, att själva arbetet/åtgärden är genomförd. Detta markerar att man är klar på platsen. Efter denna status är satt finns tid för dokumentation av utfört arbete både tekniskt och nyttjade resurser.
CLOSE	"Avslutad": När avrapportering av utförande (tekniskt om vad som gjorts, samt resursåtgång) är klar, och godkänd av Trafikverket om leverantörsgodkännande behövs, så kan Ao sättas som CLOSED (Avslutad). Arbetet är nu klart och allt som efterfrågats är avrapporterat.
DEFERRED	"Utförande pausat" Om ett utförande ej hinner bli klart vid det tillfälle man planerat, men är påbörjat (dvs Ao i status INPRG), så sätts utförandet i DEFERRED (Paus). Arbetet kan sedan återupptas vid nästa möjliga tillfälle (tex nästa tillgängliga avstängning). Arbeten i denna status kan och ska schemaläggas om till det nya tillfället innan de återupptas.
CANCELED	"Avbruten" En Ao som av någon anledning beslutats att inte genomföras före arbetet påbörjats, dvs avbryts före status INPRG har infallit, sätts i status CAN (Avbruten).

Projekt Förvaltning komplexa anläggningar. Gus-version	Page 3 of 3	Upprättad av: S-O Andersson, Uppdat: Anders Eier & Thomas Rolén	Datum 2022-09-07
Process Process FU - Förebyggande underhåll Gusver 6.0		Godkänd av: Lars Schillström	Datum 2022-10-03
